

箱根町第3次都市計画マスタープラン
主要な施策の達成状況（令和6年度）

令和8年3月
箱根町環境整備部都市整備課

【達成度判定基準】

(1) 令和6年度までの計画に対するもの

達成度	基準	
A	達成	令和6年度末までの計画の全てを実施 (達成率100%)
B	一部達成 (75%以上)	令和6年度末までの計画の一部を実施 (達成率75%以上)
C	一部達成 (50%以上)	令和6年度末までの計画の一部を実施 (達成率50%以上)
D	一部達成 (50%未満)	令和6年度末までの計画の一部を実施 (達成率50%未満)
E	未着手	実施に向けて検討している段階等 (国県要望等のみ実施を含む。)

(2) 全体の計画に対するもの

達成度	基準	
A	完成	全体の計画の全てを実施 (進捗率100%)
B	事業中 (75%以上)	全体の計画の一部を実施 (進捗率75%以上)
C	事業中 (50%以上)	全体の計画の一部を実施 (進捗率50%以上)
D	事業中 (50%未満)	全体の計画の一部を実施 (進捗率50%未満)
E	未着手	計画の実施に向けて検討している段階等 (国県要望等のみ実施を含む。)
F	休止(凍結)	実施(計画)していたが休止(凍結)
G	廃止	今後実施しないことを決定

箱根町第3次都市計画マスタープラン主要な施策一覧

地域	No.	事業等名	担当課	国県担当課	達成度		備考
					R6年度までの計画	全体計画	
湯本地域	1	小田原箱根道路湯本山崎オフランプと周辺町道等の供用開始	都市整備課	横浜国道事務所	-	A	令和3年度完成
	2	現国道1号沿道の安全確保と活性化を図るための再整備	都市整備課	横浜国道事務所 県小田原土木センター	E	E	
	3	町民と観光客の安全確保と利便性に資する町道整備(湯本地域)	都市整備課		C	C	
	4	第3号公共下水道整備	上下水道温泉課	県流域下水道整備事務所	B	C	
	5	早川親水護岸整備	都市整備課	県小田原土木センター	A	A	令和6年度完成
	6	塔之澤地区における町営水道未給水区域の整備	上下水道温泉課	-	-	G	平成30年度事業廃止
	7	箱根の東の玄関口にふさわしい賑わいのある街なみ景観の形成	都市整備課	-	D	D	
	8	観光案内所の充実やハイキングコース指導標の多言語化等の整備	観光課	-	C	B	
	9	自治会などの地域コミュニティの活動拠点となる集会所施設の充実	総務防災課	-	A	B	
温泉地域	10	宮ノ下交差点の改良と渋滞緩和の促進	都市整備課	神奈川県警 県小田原土木センター	E	E	県要望
	11	町民と観光客の安全確保と利便性に資する町道整備(温泉地域)	都市整備課	-	B	C	
	12	道路後退用地整備事業	都市整備課	-	D	D	
	13	第1号公共下水道整備(温泉地域)	上下水道温泉課	-	A	B	
	14	近代日本の歴史を偲ぶことのできる個性的な街なみにふさわしい景観の形成	都市整備課	-	D	D	
	15	豊かな自然に親しむことのできる浅間山ハイキングコースなどの維持整備	観光課	-	C	B	
	16	箱根の近代化に関わる歴史的重要な建造物の保護や探訪会などの実施	生涯学習課	-	C	C	
宮城野地域	17	県道723号(関本小涌谷)道路拡幅整備	都市整備課	県小田原土木センター	-	A	令和4年度完成
	18	町民と観光客の安全確保と利便性に資する町道整備(宮城野地域)	都市整備課	-	B	C	
	19	足柄幹線林道一般車通行規制緩和	観光課	県西地域県政総合センター	E	E	県要望
	20	宮城野地区早川沿いのさくら並木の保全	都市整備課	-	A	C	
	21	第1号公共下水道整備(宮城野地域)	上下水道温泉課	-	C	B	
	22	早雲山地すべり対策	都市整備課	県小田原土木センター	A	B	県要望
	23	瀬戸沢えん堤整備	都市整備課	県小田原土木センター	-	A	令和4年度完成
	24	強羅地区の整然と落ち着いた温泉保養地としての環境の保全および街なみ景観の形成	都市整備課	-	D	D	

仙石原地域	25	仙石原すすき草原や仙石原湿原など本地域固有の優れた自然資源の保全	企画課 観光課	環境省 県自然環境保全センター	C	C	
	26	県道75号すすき草原歩道整備	都市整備課	県小田原土木センター	-	A	令和3年度完成
	27	県道731号(南足柄市と箱根町を連絡する道路)整備	都市整備課	県小田原土木センター	-	A	令和5年度完成
	28	県道738号(仙石原新田)整備	都市整備課	県小田原土木センター	E	E	県要望
	29	町民と観光客の安全確保と利便性に資する町道整備(仙石原地域)	都市整備課	-	B	C	
	30	仙石原公園整備事業	都市整備課	-	A	D	
	31	第2号公共下水道整備(仙石原地域)	上下水道温泉課	-	C	B	
	32	大涌沢地すべり対策	都市整備課	県小田原土木センター	A	B	県要望
	33	すすき草原をはじめとする優れた自然景観の保全と高原情緒あふれる落ち着いた街なみ景観の形成	都市整備課	-	D	D	
	34	金時山ハイキングコースなどの維持整備	観光課	-	B	B	
箱根地域	35	凍雪害対策強化のための芦之湯基地の整備	観光課 都市整備課	県小田原土木センター	-	A	平成30年度完成
	36	町民と観光客の安全確保と利便性に資する町道整備(箱根地域)	都市整備課	-	B	C	
	37	第2号公共下水道整備(箱根地域)	上下水道温泉課	-	C	B	
	38	町営温泉の安定供給	上下水道温泉課	-	A	A	令和6年度完成
	39	門前町や宿場町としての歴史を生かした街なみ景観の形成	都市整備課	-	D	D	
	40	阿字ヶ池を含めた周辺整備を行うこと等による地域資源を生かした芦之湯地区の活性化	観光課	-	-	A	令和元年度完成
	41	箱根旧街道石畳ハイキングコースなどの維持整備	生涯学習課	-	C	C	
	42	国指定史跡箱根旧街道杉並木の保護	生涯学習課	-	C	C	
43	鎌倉古道などの既存の散策路を生かして地域内の回遊性を高めることによる各地区固有の歴史的文化遺産の有効活用と地域活性化	生涯学習課	-	C	D		

地域	湯本地域	番号	1
施策区分①	都市基盤整備	施策区分②	道路

事業等名	小田原箱根道路湯本山崎オフランプと周辺町道等の供用開始		
所管	町	環境整備部都市整備課	
	町以外の機関	国土交通省横浜国道事務所	
事業年度	平成2年度 ~ 令和3年度		


平成29年度～令和8年度（本プラン計画期間）の事業等の概要
 国道1号小田原箱根線（小田原箱根道路）の未供用部分である湯本山崎オフランプ及び同接続町道（湯13号線）等の整備を行う。

令和6年度までの事業等の実施状況

計画達成度		年度	内容
令和6年度まで	全体	平成29年度 ～令和3年度	主要な施策の達成状況(前期分)参照
A	(完成)		

令和7年度の事業等の執行予定

※令和3年度をもって事業完結。

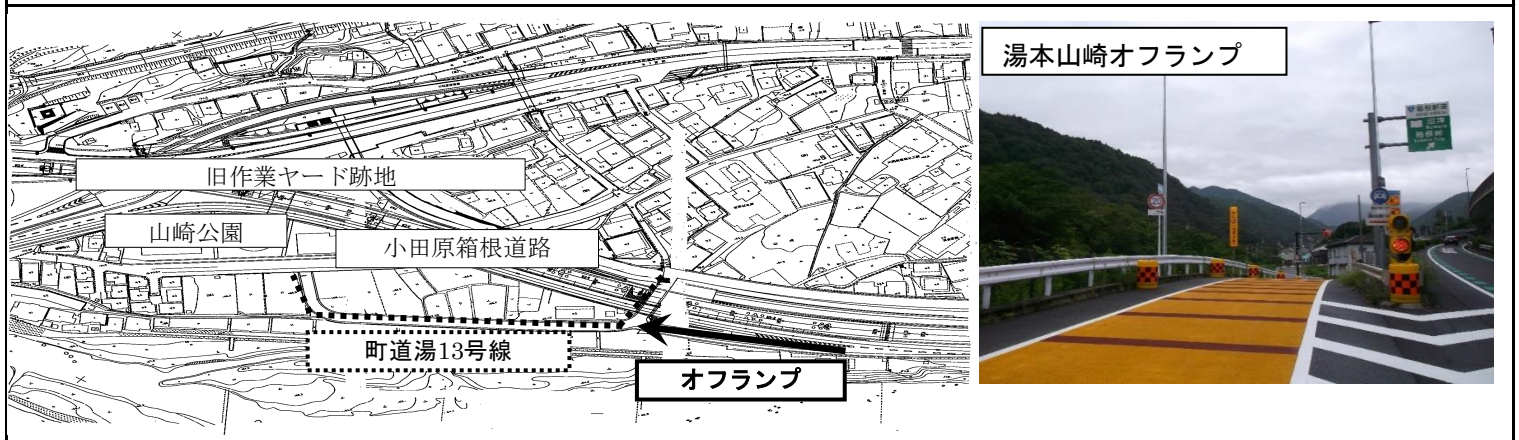

地域	湯本地域	番号	2
施策区分①	都市基盤整備	施策区分②	道路

事業等名	現国道1号沿道の安全確保と活性化を図るための再整備		
所管	町	環境整備部都市整備課	
	町以外の機関	国土交通省横浜国道事務所・神奈川県西土木事務所小田原土木センター	
事業年度	～		

平成29年度～令和8年度（本プラン計画期間）の事業等の概要


現国道1号沿道の安全確保と活性化を図るため、小田原箱根道路への交通の転換状況をみながら、現国道1号の再整備を実施する。

令和6年度までの事業等の実施状況

計画達成度		年度	内容
令和6年度まで	全体	平成29年度～令和3年度	主要な施策の達成状況(前期分)参照
E (未着手) (実施に向け検討中)	E (未着手) (実施に向け検討中)	令和4年度	・関係機関で協議を実施。
		令和5年度	・関係機関で協議を実施。
		令和6年度	・関係機関で協議を実施。

令和7年度の事業等の執行予定

・関係機関で協議を実施。

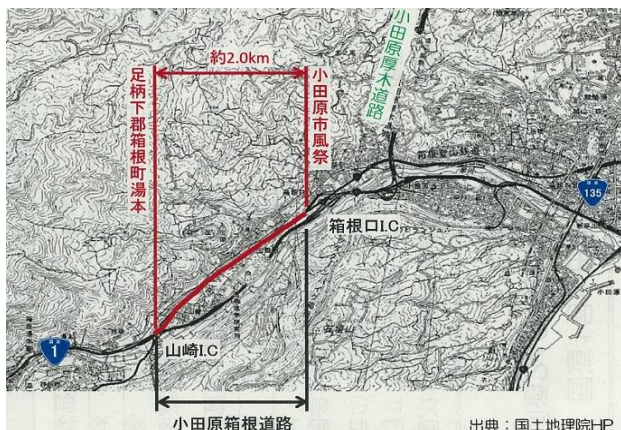

資料提供：国土交通省横浜国道事務所

地域	湯本地域	番号	3
施策区分①	都市基盤整備	施策区分②	道路

事業等名	町民と観光客の安全確保と利便性に資する町道整備（湯本地域）		
所管	町	環境整備部都市整備課	
	町以外の機関	-	
事業年度	平成29年度 ～ 令和8年度		

平成29年度～令和8年度（本プラン計画期間）の事業等の概要

路面状態の調査を基に老朽化している路線から優先的に舗装の打替えを行う等、町道の道路機能が維持されるよう適切に管理を行う。

令和6年度までの事業等の実施状況

計画達成度		年度	内容
令和6年度まで	全体	平成29年度 ～令和3年度	主要な施策の達成状況(前期分)参照
C (一部達成) (達成率50%以上)	C (事業中) (進捗率50%以上)	令和4年度	・町道湯2号線道路改良整備工事 不明管調査及び路線測量を実施。
		令和5年度	・町道湯71号線道路整備工事(L=61.9m)を実施。 ・町道湯119号線道路整備事業 測量調査委託を実施。 ・町道湯2号線道路改良整備事業 地質調査委託を実施。
		令和6年度	・町道湯71号線道路整備工事(L=140m)を実施。 ・町道湯119号線道路整備工事(L=25.4m)を実施。

令和7年度の事業等の執行予定

・町道湯71号線道路整備工事(L=100m)を実施。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

地域	湯本地域	番号	4
施策区分①	都市基盤整備	施策区分②	下水道・河川

事業等名	第3号公共下水道整備事業		
所管	町	環境整備部上下水道温泉課	
	町以外の機関	神奈川県流域下水道整備事務所	
事業年度	平成19年度 ~ 令和12年度		

平成29年度～令和8年度（本プラン計画期間）の事業等の概要

神奈川県が酒匂川流域下水道（箱根小田原幹線）の整備を行う。町は、令和7年度から山崎地区の面整備を進める。

令和6年度までの事業等の実施状況

計画達成度		年度	内容
令和6年度まで	全体	平成29年度 ～令和3年度	主要な施策の達成状況(前期分)
B (一部達成) (達成率75%以上)	C (事業中) (進捗率50%以上)	令和4年度	・箱根小田原幹線の1-3工区、久野川護岸及び推進工事完了。 ・箱根小田原幹線の4工区を引き続き施工。
		令和5年度	・箱根小田原幹線の3工区及び4工区を施工。 ・幹線工事の進捗状況を踏まえ、全体の計画達成度の見直しを実施。
		令和6年度	・箱根小田原幹線の3工区及び4工区を施工。

令和7年度の事業等の執行予定

- ・箱根小田原幹線の5・6・7工区の解析業務を実施。
- ・箱根小田原幹線の2・3・4工区の施工。



地域	湯本地域	番号	5
施策区分①	都市基盤整備	施策区分②	下水道・河川

事業等名	早川親水護岸整備		
所管	町	環境整備部都市整備課	
	町以外の機関	神奈川県県西土木事務所小田原土木センター	
事業年度	平成2年度 ～ 令和6年度		

平成29年度～令和8年度（本プラン計画期間）の事業等の概要


二級河川早川について、治水機能の向上による安全性を高めるとともに、快適な水辺空間の環境整備を促進する。箱根町内の予定約400mのうち、上流側約300mの護岸整備を行う。

令和6年度までの事業等の実施状況

計画達成度		年度	内容
令和6年度まで	全体	平成29年度 ～令和3年度	主要な施策の達成状況(前期分)参照
A (達成) (達成率100%)	A (完成)	令和4年度	・護岸工（L = 40m）を実施。
		令和5年度	・護岸工（L = 120m）を実施。
		令和6年度	・護岸工（L = 120m）を実施し、令和6年8月に完成。

令和7年度の事業等の執行予定

※令和6年度をもって事業完結。

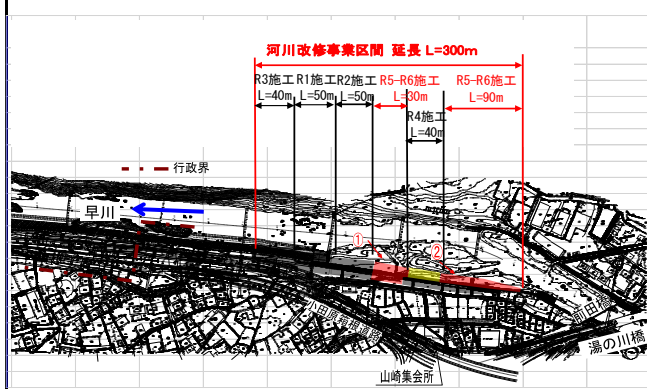

資料提供：神奈川県小田原土木センター

地域	湯本地域	番号	6
施策区分①	都市基盤整備	施策区分②	水道

事業等名	塔之澤地区における町営水道未給水区域の整備		
所管	町	環境整備部上下水道温泉課	
	町以外の機関	-	
事業年度	平成11年度 ~ 平成30年度		

平成29年度～令和8年度（本プラン計画期間）の事業等の概要

塔之澤地区における町営水道の未給水区域について、整備を行う。

令和6年度までの事業等の実施状況

計画達成度	年度	年度	内容
令和6年度まで	全体	平成29年度 ～令和3年度	主要な施策の達成状況(前期分)参照
G (廃止)			

令和7年度の事業等の執行予定

・水道本管延伸予定先の利用者（事業所等）に意向確認をしたところ、町営水道を主たる水道として使用する意向なしとの回答を得たので、水道管路布設事業を平成30年度をもって終了とした。



地域	湯本地域	番号	7
施策区分①	景観形成	施策区分②	-

事業等名	箱根の東の玄関口にふさわしい賑わいのある街なみ景観の形成		
所管	町	環境整備部都市整備課	
	町以外の機関	-	
事業年度	平成21年度 ~ 令和10年度		

平成29年度～令和8年度（本プラン計画期間）の事業等の概要

町固有の優れた自然景観の保全と歴史や文化に根差した街なみ景観の形成を図る。

令和6年度までの事業等の実施状況

計画達成度		年度	内容
令和6年度まで	全体	平成29年度 ～令和3年度	主要な施策の達成状況(前期分)参照
D (一部達成) (達成率50%未満)	D (事業中) (進捗率50%未満)	令和4年度	<ul style="list-style-type: none"> ・フェイスブックページによる定期的な広報の継続。 ・インスタグラムによる定期的な広報の継続。 ・景観セミナーの開催。 ・景観スポットであるあじさい橋の清掃を実施。 ・重要文化財である旭橋の草刈りを実施。
		令和5年度	<ul style="list-style-type: none"> ・フェイスブックページによる定期的な広報の継続。 ・インスタグラムによる定期的な広報の継続。 ・景観色彩パンフレット作成。 ・景観スポットであるあじさい橋の清掃を実施。 ・重要文化財である旭橋の草刈りを実施。
		令和6年度	<ul style="list-style-type: none"> ・フェイスブックページによる定期的な広報の継続。 ・インスタグラムによる定期的な広報の継続。 ・景観色彩パンフレット増刷。 ・景観スポットであるあじさい橋の清掃を実施。 ・まちづくりアドバイザーに1名新たに委嘱。

令和7年度の事業等の執行予定

- ・ 広報、回覧、その他SNS等による景観施策の周知、街並み景観の紹介。
- ・ 景観まちづくり協力店認定制度の周知及び推進。
- ・ 景観まちづくり修景費補助制度の周知及び推進。
- ・ まちづくりアドバイザー派遣制度の周知及び促進。

<p>●景観まちづくり協力店（湯本地域）</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">湯本地域第4号店 箱根 甘酒茶屋</div> 	<p>●箱根町景観だより（インスタグラム）</p> 
---	---

地域	湯本地域	番号	8
施策区分①	その他	施策区分②	観光

事業等名	観光案内所の充実やハイキングコース指導標の多言語化等の整備		
所管	町	企画観光部観光課	
	町以外の機関	-	
事業年度	平成20年度 ~ 令和8年度		

平成29年度～令和8年度（本プラン計画期間）の事業等の概要

国際観光地「箱根」の玄関口にふさわしい受入環境の整備を図る。町が管理するハイキングコースすべての指導標・解説板等を多言語化していく予定であり、その際、外国人観光客にもわかりやすいバス停や駅等を示したピクトグラムも積極的に活用する。

令和6年度までの事業等の実施状況

計画達成度		年度	内容
令和6年度まで	全体	平成29年度 ～令和3年度	主要な施策の達成状況(前期分)参照
C (一部達成) (達成率50%以上)	B (事業中) (進捗率75%以上)	令和4年度	・屏風山山頂及び湖尻峠山頂の解説板を改修した。 ・阿弥陀寺一塔ノ峰コース及び矢倉沢一明神コースの指導標を改修した。
		令和5年度	・屏風山及び金時山周辺等、一部のハイキングコースにおいて指導標の改修工事を実施した。
		令和6年度	・防ヶ沢～神山コースの開通に向け整備を実施した。また、それに伴う指導用や案内板の多言語標記やピクトグラムの掲載を行った。 ・金時山ハイキングコース沿いにある金太郎伝説ゆかりのスポットの4箇所に説明版を設置した。説明版には英語標記を記載し、更にQRコードを活用し多言語化を図った。

令和7年度の事業等の執行予定

・今後も全コースにおいて多言語及びピクトグラム等を活用した指導標及び案内板を設置することができるよう、予算措置等を含めて検討する。



外貨自動両替機（12種類の外貨に対応）
Automatic Money Exchange Service

令和元年度 →
指導標設置



地域	湯本地域	番号	9
施策区分①	その他	施策区分②	地域コミュニティ

事業等名	自治会などの地域コミュニティの活動拠点となる集会所施設の充実		
所管	町	総務部町民課	
	町以外の機関	-	
事業年度	平成29年度 ~		

平成29年度～令和8年度（本プラン計画期間）の事業等の概要

湯本地域の町立集会所については、町民のコミュニティー活動の推進のため、修繕等が必要な個所を優先度の高いものから順次維持補修を行い、長期にわたり利用ができるように整備に努める。

令和6年度までの事業等の実施状況

計画達成度		年度	内容
令和6年度まで	全体	平成29年度 ～令和3年度	主要な施策の達成状況(前期分)参照
A	B	令和4年度	・山崎集会所の空調設備及び外壁のひび割れの修繕を実施。
		令和5年度	・山崎集会所和室の畳の張替えを実施。 ・仲町集会所の灯具をLED灯具へ更新を実施。
		令和6年度	・山崎集会所及び仲町集会所の浄化槽設備の修繕を実施。

令和7年度の事業等の執行予定

・山崎集会所 1 階会議室のエアコン入替を実施。

地域	温泉地域	番号	10
施策区分①	都市基盤整備	施策区分②	道路

事業等名	宮ノ下交差点の改良と渋滞緩和の促進		
所管	町	環境整備部都市整備課	
	町以外の機関	神奈川県警察、神奈川県小田原土木センター	
事業年度	～		

平成29年度～令和8年度（本プラン計画期間）の事業等の概要

国道1号と国道138号が交差し、箱根町の道路交通の要所である宮ノ下交差点の渋滞緩和を促進する。

令和6年度までの事業等の実施状況

計画達成度		年度	内容
令和6年度まで	全体	平成29年度～令和3年度	主要な施策の達成状況(前期分)参照
E (未着手) (実施に向け検討中)	E (未着手) (実施に向け検討中)	令和4年度	・道路管理者に対し、更なる車両の分散化を図るため、近隣の路線への交通情報板の設置等を引き続き要望。
		令和5年度	・道路管理者に対し、更なる車両の分散化を図るため、近隣の路線への交通情報板の設置等を引き続き要望。
		令和6年度	・道路管理者に対し、更なる車両の分散化を図るため、近隣の路線への交通情報板の設置等を引き続き要望。

令和7年度の事業等の執行予定

・道路管理者に対し、更なる車両の分散化を図るため、近隣の路線への交通情報板の設置等を引き続き要望。

県警交通情報板（国道1号：箱根）



県警交通情報板（県道75号：仙石原）



地域	温泉地域	番号	11
施策区分①	都市基盤整備	施策区分②	道路

事業等名	町民と観光客の安全確保と利便性に資する町道整備（温泉地域）		
所管	町	環境整備部都市整備課	
	町以外の機関	-	
事業年度	平成29年度 ~ 令和8年度		

平成29年度～令和8年度（本プラン計画期間）の事業等の概要

路面状態の調査を基に老朽化している路線から優先的に舗装の打替えを行う等、町道の道路機能が維持されるよう適切に管理を行う。

令和6年度までの事業等の実施状況

計画達成度		年度	内容
令和6年度まで	全体	平成29年度 ～令和3年度	主要な施策の達成状況(前期分)参照
B (一部達成) (達成率75%以上)	C (事業中) (進捗率50%以上)	令和4年度	・町道温37号線排水管改修工事(側溝工 L =11m)を実施。
		令和5年度	・町道温1号線道路整備工事(L =14.3m)を実施。
		令和6年度	・町道温1号線道路整備工事(L =70m)を実施。

令和7年度の事業等の執行予定

町道温1号線道路整備工事(L =80m)を実施。

地域	温泉地域	番号	12
施策区分①	都市基盤整備	施策区分②	道路

事業等名	道路後退用地整備事業		
所管	町	環境整備部都市整備課	
	町以外の機関	-	
事業年度	平成5年度 ~		

平成29年度～令和8年度（本プラン計画期間）の事業等の概要

建築基準法第42条第2項に該当する狭あいな町道等に接した敷地への建築行為における道路後退用地の整備補助を行う。


令和6年度までの事業等の実施状況

計画達成度		年度	内容
令和6年度まで	全体	平成29年度～令和3年度	主要な施策の達成状況(前期分)参照
D (一部達成) (達成率50%未満)	D (事業中) (進捗率50%未満)	令和4年度	・温泉地域においては、案件なし。 ・町道における1件（湯本地域）の事前測量、3件（湯本地域1件、仙石原地域2件）の買取りを実施。
		令和5年度	・温泉地域においては、案件なし。 ・町道における2件（湯本地域2件）の舗装工事、2件（湯本地域1件、仙石原地域1件）の買取りを実施。
		令和6年度	・温泉地域においては、案件なし。 ・町道における1件（仙石原地域）の事前測量、1件（仙石原地域）の舗装工事、1件（仙石原地域）の買取りを実施。

令和7年度の事業等の執行予定

・引き続き、建築行為等における道路後退を推進する。

●道路後退例

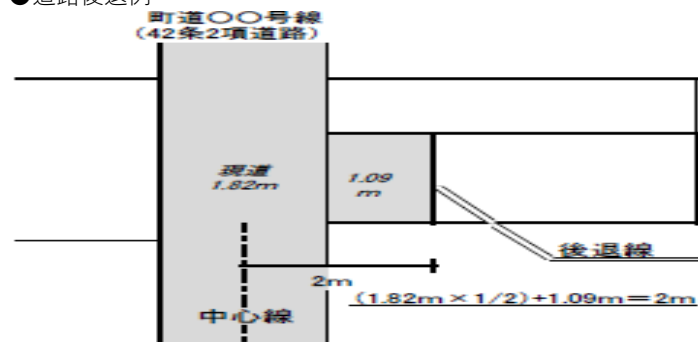

地域	温泉地域	番号	13
施策区分①	都市基盤整備	施策区分②	下水道

事業等名	第1号公共下水道整備（温泉地域）		
所管	町	環境整備部上下水道温泉課	
	町以外の機関	-	
事業年度	昭和47年度 ~ 令和12年度		

平成29年度～令和8年度（本プラン計画期間）の事業等の概要

公共下水道未供用区域の整備と終末処理場やポンプ場の長寿命化を進める。

令和6年度までの事業等の実施状況

計画達成度		年度	内容
令和6年度まで	全体	平成29年度 ～令和3年度	主要な施策の達成状況(前期分)参照
A	B	令和4年度	・事業なし
		令和5年度	・事業なし
		令和6年度	・事業なし
(達成) (達成率100%)	(事業中) (進捗率75%以上)		

令和7年度の事業等の執行予定

・予定なし

管路施設建設改良事業
第1号公共下水道工事（路面復旧）



令和3年度施工 路面復旧工事 L=275m

着手前



完成



地域	温泉地域	番号	14
施策区分①	景観形成	施策区分②	—

事業等名	近代日本の歴史を偲ぶことのできる個性的な街なみにふさわしい景観の形成		
所管	町	環境整備部都市整備課	
	町以外の機関	—	
事業年度	平成21年度 ～ 令和10年度		

平成29年度～令和8年度（本プラン計画期間）の事業等の概要

町固有の優れた自然景観の保全と歴史や文化に根差した街なみ景観の形成を図る。

令和6年度までの事業等の実施状況

計画達成度		年度	内容
令和6年度まで	全体	平成29年度 ～令和3年度	主要な施策の達成状況(前期分)参照
D (一部達成) (達成率50%未満)	D (事業中) (進捗率50%未満)	令和4年度	・フェイスブックページによる定期的な広報の継続。 ・インスタグラムによる定期的な広報の継続。 ・景観セミナーの開催。
		令和5年度	・フェイスブックページによる定期的な広報の継続。 ・インスタグラムによる定期的な広報の継続。 ・景観色彩パンフレット作成。
		令和6年度	・フェイスブックページによる定期的な広報の継続。 ・インスタグラムによる定期的な広報の継続。 ・景観色彩パンフレット増刷。 ・まちづくりアドバイザーに1名新たに委嘱。

令和7年度の事業等の執行予定

- ・ 広報、回覧、その他SNS等による景観施策の周知、街並み景観の紹介。
- ・ 景観まちづくり協力店認定制度の周知及び推進。
- ・ 景観まちづくり修景費補助制度の周知及び推進。
- ・ まちづくりアドバイザー派遣制度の周知及び促進。

<p>●景観まちづくり協力店（温泉地域）</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">温泉地域第3号店 カフェ・ド・モトナミ</p>  </div>	<p>●箱根町景観だより（インスタグラム）</p>  <p>「いいね！」20件 hakonekeikan ～アジサイインスタグラムハコネシリーズ～ 箱根登山鉄道沿線では、あじさいのライトアップがされている場所があります！撮影場所は大</p>
---	---

地域	温泉地域	番号	15
施策区分①	その他	施策区分②	自然探勝路

事業等名	豊かな自然に親しむことのできる浅間山ハイキングコースなどの維持整備		
所管	町	企画観光部観光課	
	町以外の機関	-	
事業年度	平成20年度 ~ 令和8年度		

平成29年度～令和8年度（本プラン計画期間）の事業等の概要

ハイキングコースの維持整備を行うとともに、外国人観光客にも適切な誘導を図れるようにするため、指導標等の多言語化やピクトグラムの活用を推進する。

令和6年度までの事業等の実施状況

計画達成度		年度	内容
令和6年度まで	全体	平成29年度 ～令和3年度	主要な施策の達成状況(前期分)参照
C (一部達成) (達成率50%以上)	B (事業中) (進捗率75%以上)	令和4年度	・倒木等でハイキングコースの通行に支障が生じた際は、随時対応を行った。 ・ハイキングコースの状況や案内板などの現状把握のため、定期的な見回り調査を行った。
		令和5年度	・ハイキングコース内に発生した倒木については、通報があった際や踏査を行った際に随時対応を行った。
		令和6年度	・定期的にハイキングコースの状況や案内板などの現状把握のため、巡回及び調査を行った。 ・コース内のスズメバチの巣を撤去した。

令和7年度の事業等の執行予定

- ・ハイキングコース内の点検及び巡視は引き続き定期的実施する。
- ・多言語に対応した案内板の設置については今後検討する。



地域	温泉地域	番号	16
施策区分①	その他	施策区分②	文化財

事業等名	箱根の近代化に関わる歴史的建造物の保護や探訪会などの実施		
所管	町	教育委員会生涯学習課	
	町以外の機関	-	
事業年度	平成8年度 ~		

平成29年度～令和8年度（本プラン計画期間）の事業等の概要

町内近代化遺産の国重文指定や国登録文化財登録の推進、文化財保護条例改正による特定歴史的建造物登録制度の導入と活用、町内近代化遺産の調査（平成12年度からの継続）、箱根町内にある近代化遺産普及活動としての探訪会等の実施等を行う。

令和6年度までの事業等の実施状況

計画達成度		年度	内容
令和6年度まで	全体	平成29年度 ～令和3年度	主要な施策の達成状況(前期分)参照
C (一部達成) (達成率50%以上)	C (事業中) (進捗率50%以上)	令和4年度	<ul style="list-style-type: none"> 町内近代化遺産の国登録有形文化財に向けた事務手続き。 町内近代化遺産の調査。 町内近代化遺産の文化財の保存・改修工事支援。 箱根探訪会の実施(名勝神仙郷見学会、松の茶屋見学会)
		令和5年度	<ul style="list-style-type: none"> 町内近代化遺産の国登録有形文化財への意見具申及び登録。 町内近代化遺産の調査。 町内近代化遺産の文化財の保存・改修工事支援。 箱根探訪会の実施(4回)。
		令和6年度	<ul style="list-style-type: none"> 町内近代化遺産の国登録有形文化財に向けた事務手続き。 町内近代化遺産の調査。 町内近代化遺産の文化財の保存・改修工事支援。 箱根探訪会の実施(3回)。

令和7年度の事業等の執行予定

- 町内近代化遺産の国登録有形文化財に向けた事務手続き。
- 町内近代化遺産の調査。
- 町内近代化遺産の文化財の保存・改修工事支援。
- 箱根探訪会の実施(3回)。

●箱根探訪会（富士屋ホテル見学会）



地域	宮城野地域	番号	17
施策区分①	都市基盤整備	施策区分②	道路・林道

事業等名	県道723号（関本小涌谷）道路拡幅整備		
所管	町	環境整備部都市整備課	
	町以外の機関	神奈川県県西土木事務所小田原土木センター	
事業年度	平成25年度 ～ 令和4年度		

平成29年度～令和8年度（本プラン計画期間）の事業等の概要

宮城野地区と強羅・二ノ平地区を結ぶ幹線道路である県道723号の拡幅整備工事を行う。延長L = 300 m、標準幅員W = 8.0 m

令和6年度までの事業等の実施状況

計画達成度		年度	内容
令和6年度まで	全体	平成29年度～令和3年度	主要な施策の達成状況(前期分)参照
		令和4年度	<ul style="list-style-type: none"> ・残区間約10mの道路拡幅道路拡幅工事を実施。 ・追加で必要となった安全対策工事（防護柵、警戒標識、カラー舗装等）を実施。
A (完成)			

令和7年度の事業等の執行予定

※令和4年度をもって事業完結。



資料提供：神奈川県小田原土木センター

地域	宮城野地域	番号	18
施策区分①	都市基盤整備	施策区分②	道路・林道

事業等名	町民と観光客の安全確保と利便性に資する町道整備（宮城野地域）		
所管	町	環境整備部都市整備課	
	町以外の機関	-	
事業年度	平成29年度 ~ 令和8年度		

平成29年度～令和8年度（本プラン計画期間）の事業等の概要

路面状態の調査を基に老朽化している路線から優先的に舗装の打替えを行う等、町道の道路機能が維持されるよう適切に管理を行う。

令和6年度までの事業等の実施状況

計画達成度		年度	内容
令和6年度まで	全体	平成29年度 ～令和3年度	主要な施策の達成状況(前期分)参照
B (一部達成) (達成率75%以上)	C (事業中) (進捗率50%以上)	令和4年度	・町道宮185号線道路整備工事(A s 舗装工 L = 130m)を実施。
		令和5年度	・町道宮12号線道路整備工事(L = 215.5m)を実施。 ・町道宮185号線道路整備工事(L = 120m)を実施。
		令和6年度	・町道宮185号線道路整備工事(L = 130m)を実施。 ・町道宮13号線道路整備工事(L = 120m)を実施。 ・町道宮17号線道路整備工事(L = 102.8m)を実施。

令和7年度の事業等の執行予定

・町道宮185号線道路整備工事(L = 140m)を実施。
・町道宮13号線道路整備工事(L = 130m)を実施。

地域	宮城野地域	番号	19
施策区分①	都市基盤整備	施策区分②	道路・林道

事業等名	足柄幹線林道一般車通行規制緩和		
所管	町	企画観光部観光課	
	町以外の機関	神奈川県県西地域県政総合センター	
事業年度	～		

平成29年度～令和8年度（本プラン計画期間）の事業等の概要

地域の利便性向上や災害時の代替ルートとしての活用が望まれている足柄幹線林道の通行規制緩和を促進する。

令和6年度までの事業等の実施状況

計画達成度		年度	内容
令和6年度まで	全体	平成29年度～令和3年度	主要な施策の達成状況(前期分)参照
E (未着手) (実施に向け検討中)	E (未着手) (実施に向け検討中)	令和4年度	・神奈川県町村会を通じて「県の施策・予算に関する要望」にて、道路舗装の整備や冬季の閉鎖期間の短縮に係る要望を実施。
		令和5年度	・神奈川県町村会を通じて「県の施策・予算に関する要望」にて、道路舗装の整備や冬季の閉鎖期間の短縮に係る要望を実施。
		令和6年度	・神奈川県町村会を通じて「県の施策・予算に関する要望」にて、道路舗装の整備や冬季の閉鎖期間の短縮に係る要望を実施。

令和7年度の事業等の執行予定

・地域の利便性向上や災害時の代替ルートとしての活用を図るため、道路舗装の整備や冬季の閉鎖期間の短縮を引き続き要望。

●現況写真



地域	宮城野地域	番号	20
施策区分①	都市基盤整備	施策区分②	公園・緑地

事業等名	宮城野地区早川沿いのさくら並木の保全		
所管	町	環境整備部都市整備課	
	町以外の機関	-	
事業年度	～		

平成29年度～令和8年度（本プラン計画期間）の事業等の概要

地域資源である宮城野地区早川沿いのさくら並木の保全を図る。

令和6年度までの事業等の実施状況

計画達成度		年度	内容
令和6年度まで	全体	平成29年度 ～令和3年度	主要な施策の達成状況(前期分)参照
A (達成) (達成率100%)	C (事業中) (進捗率50%以上)	令和4年度	・樹木の病害虫や天狗巣病剪定を実施。 ・生垣の剪定を実施。
		令和5年度	・樹木の病害虫防除や天狗巣病剪定を実施。 ・生垣の剪定を実施。
		令和6年度	・樹木の病害虫防除や天狗巣病剪定を実施。 ・生垣の剪定を実施。

令和7年度の事業等の執行予定

- ・害虫駆除等により樹木の保全を図る。
- ・生垣の剪定を実施。



地域	宮城野地域	番号	21
施策区分①	都市基盤整備	施策区分②	下水道

事業等名	第1号公共下水道整備（宮城野地域）		
所管	町	環境整備部上下水道温泉課	
	町以外の機関	-	
事業年度	昭和47年度 ~ 令和12年度		

平成29年度～令和8年度（本プラン計画期間）の事業等の概要

公共下水道未供用区域の整備と終末処理場やポンプ場の長寿命化を進める。

令和6年度までの事業等の実施状況

計画達成度		年度	内容
令和6年度まで	全体	平成29年度 ～令和3年度	主要な施策の達成状況(前期分)参照
C (一部達成) (達成率50%以上)	B (事業中) (進捗率75%以上)	令和4年度	<ul style="list-style-type: none"> 未整備区域の管渠布設を行い、供用開始面積を増加させた。 管渠布設後の路面復旧を実施。
		令和5年度	<ul style="list-style-type: none"> 未整備区域の管渠布設を行い、供用開始面積を増加させた。 管渠布設後の路面復旧を実施。 宮城野浄水センター水処理機械設備の老朽化が進んだ機器を更新した。 新田ポンプ場の老朽化が進んだ汚水ポンプを更新した。
		令和6年度	<ul style="list-style-type: none"> 宮城野浄水センターのコンデンサ盤、水質計器の更新工事を発注。 未整備区域の管渠布設を行い、供用開始面積を増加させ、管渠布設後の路面復旧を実施。

令和7年度の事業等の執行予定

- 令和6年度に引き続き、宮城野浄水センターのコンデンサ盤、水質計器の更新工事を実施。
- 未整備区域の管渠布設及び路面復旧を引き続き実施。



地域	宮城野地域	番号	22
施策区分①	都市基盤整備	施策区分②	砂防

事業等名	早雲山地すべり対策		
所管	町	環境整備部都市整備課	
	町以外の機関	神奈川県県西土木事務所小田原土木センター	
事業年度	平成25年度 ~		

平成29年度～令和8年度（本プラン計画期間）の事業等の概要


昭和28年に大規模地滑りが発生した早雲山の地滑り対策工事と下流部の須沢での砂防工事により土砂災害の防止を図る。具体的には、北側ブロックについて、グラウンドアンカー工（全135本）及び吹付法砕工（全3,136㎡）による地すべり対策工事を実施する。

令和6年度までの事業等の実施状況

計画達成度		年度	内容
令和6年度まで	全体	平成29年度 ～令和3年度	主要な施策の達成状況(前期分)参照
A (達成) (達成率100%)	B (事業中) (進捗率75%以上)	令和4年度	・グラウンドアンカー工 N = 21本、吹付法砕工 A = 185㎡を実施。
		令和5年度	・グラウンドアンカー工 N = 27本を実施。
		令和6年度	・グラウンドアンカー工 N = 16本、吹付法砕工 A = 663㎡を実施。

令和7年度の事業等の執行予定

・吹付法砕工 A = 704㎡を実施。

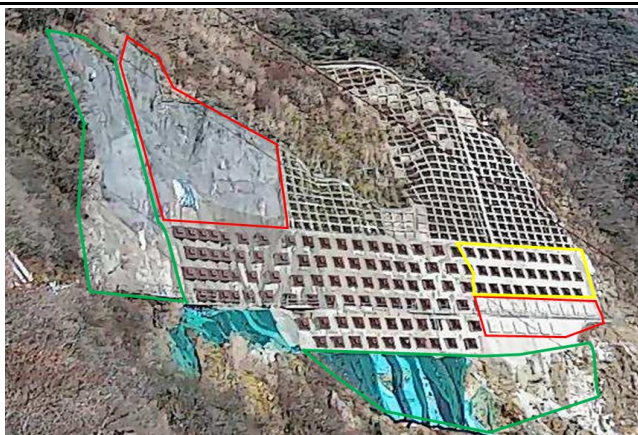

早雲山 地すべり対策工事 進捗状況

- 黄色：令和5年度施工箇所
- 赤色：令和6年度施工予定箇所
- 緑色：令和7年度以降計画

資料提供：神奈川県小田原土木センター

地域	宮城野地域	番号	23
施策区分①	都市基盤整備	施策区分②	砂防

事業等名	瀬戸沢えん堤整備		
所管	町	環境整備部都市整備課	
	町以外の機関	神奈川県県西土木事務所小田原土木センター	
事業年度	平成12年度 ~ 令和4年度		

平成29年度～令和8年度（本プラン計画期間）の事業等の概要

宮城野地区の良好な住居環境を土石流災害から保護するため、荒廃が進む瀬戸沢におけるえん堤の整備を行う。

令和6年度までの事業等の実施状況

計画達成度		年度	内容
令和6年度まで	全体	平成29年度 ～令和3年度	主要な施策の達成状況(前期分)参照
	A (完成)	令和4年度	・砂防えん堤整備工を実施。

令和7年度の事業等の執行予定

※令和4年度をもって事業完結。



地域	宮城野地域	番号	24
施策区分①	景観形成	施策区分②	—

事業等名	強羅地区の整然と落ち着いた温泉保養地としての環境の保全および街なみ景観の形成		
所管	町	環境整備部都市整備課	
	町以外の機関	—	
事業年度	平成21年度 ~ 令和10年度		

平成29年度～令和8年度（本プラン計画期間）の事業等の概要

町固有の優れた自然景観の保全と歴史や文化に根差した街なみ景観の形成を図る。

令和6年度までの事業等の実施状況

計画達成度		年度	内容
令和6年度まで	全体	平成29年度 ～令和3年度	主要な施策の達成状況(前期分)参照
D (一部達成) (達成率50%未満)	D (事業中) (進捗率50%未満)	令和4年度	・フェイスブックページによる定期的な広報の継続。 ・インスタグラムによる定期的な広報の継続。 ・景観セミナーの開催。
		令和5年度	・フェイスブックページによる定期的な広報の継続。 ・インスタグラムによる定期的な広報の継続。 ・景観色彩パンフレット作成。
		令和6年度	・フェイスブックページによる定期的な広報の継続。 ・インスタグラムによる定期的な広報の継続。 ・景観色彩パンフレット増刷。 ・まちづくりアドバイザーに1名新たに委嘱。

令和7年度の事業等の執行予定

- ・ 広報、回覧、その他SNS等による景観施策の周知、街並み景観の紹介。
- ・ 景観まちづくり協力店認定制度の周知及び推進。
- ・ 景観まちづくり修景費補助制度の周知及び推進。
- ・ まちづくりアドバイザー派遣制度の周知及び促進。

●景観まちづくり協力店（宮城野地域・募集中）



●箱根町景観だより（インスタグラム）



地域	仙石原地域	番号	25
施策区分①	自然環境保全	施策区分②	—

事業等名	仙石原すすき草原や仙石原湿原など本地域固有の優れた自然資源の保全		
所管	町	企画観光部企画課・観光課	
	町以外の機関	環境省富士箱根伊豆国立公園管理事務所、神奈川県自然環境保全センター	
事業年度	昭和60年度 ～		

平成29年度～令和8年度（本プラン計画期間）の事業等の概要

地域固有の優れた自然資源の保全を図る。

令和6年度までの事業等の実施状況

計画達成度		年度	内容
令和6年度まで	全体	平成29年度～令和3年度	主要な施策の達成状況(前期分)参照
C (一部達成) (達成率50%以上)	C (事業中) (進捗率50%以上)	令和4年度	<ul style="list-style-type: none"> 引き続き、「火入れ」を実施。 すすき草原内遊歩道については、路面状況が良好であったため、補修は未実施。 シカ対策については、湿原に設置しているシカ柵の高さを上げる等の改良を実施することで、シカの侵入を更に防止した。 未来に残したい草原の里100選に応募。
		令和5年度	<ul style="list-style-type: none"> 引き続き、「火入れ」を実施。 すすき草原内遊歩道については、路面状況が良好であったため、補修は未実施。 シカ対策については、シカ柵の点検・補修を月1回行い、湿原内に設置しているシカ柵を4～5枚に1枚の間隔で扉式のものに変更する作業を実施。 湿原内の動植物について詳細な調査をするための体制を構築。
		令和6年度	<ul style="list-style-type: none"> 引き続き、仙石原すすき草原山焼き実行委員会による「火入れ」を実施。 すすき草原内遊歩道の補修は未実施だが、台風や大雨の影響により水路に土砂が滞留しているため、浚渫を実施。 シカ対策については、シカ柵の点検・補修を月1回行い、湿原内に設置しているシカ柵を4～5枚に1枚の間隔で扉式のものに変更する作業を実施。 令和7年度に予定している「仙石原湿原モニタリング調査」の事前準備の実施。

令和7年度の事業等の執行予定

- ・仙石原すすき草原山焼き実行委員会による「火入れ」の継続実施。
- ・遊歩道については、路面状況を注視しつつ随時補修をするが、環境省に相談し中長期的な補修ができるよう検討していく。
- ・今後のシカ対策については、国、県、町で調整し、引き続きシカ柵の改良及び維持補修等を行っていく。また、シカ柵の補修をするだけでなく、捕獲の強化などができるよう関係各所と連携して根本的な解決を目指す。引き続き、令和3年度に策定した第3期計画に沿って保全を行う。
- ・令和3年度に策定した「第3期仙石原湿原保全計画」に基づき、湿原に生息する生態系の詳細な調査である「仙石原湿原モニタリング調査」を実施。

すすき草原火入れ



すすき草原内遊歩道



シカ進入防止柵



地域	仙石原地域	番号	26
施策区分①	都市基盤整備	施策区分②	道路

事業等名	県道75号すすき草原歩道整備		
所管	町	環境整備部都市整備課	
	町以外の機関	神奈川県県西土木事務所小田原土木センター	
事業年度	平成19年度 ~ 令和3年度		

平成29年度～令和8年度（本プラン計画期間）の事業等の概要


貴重な生態系を有する「仙石原すすき草原」及び「仙石原湿原」周辺の安全な散策のために、県道75号のすすき草原付近において、貴重な自然資源への影響に配慮した歩道整備を実施する。

令和6年度までの事業等の実施状況

計画達成度		年度	内容
令和6年度まで	全体	平成29年度 ～令和3年度	主要な施策の達成状況(前期分)参照
A (完成)			

令和7年度の事業等の執行予定

※令和3年度をもって事業完結。

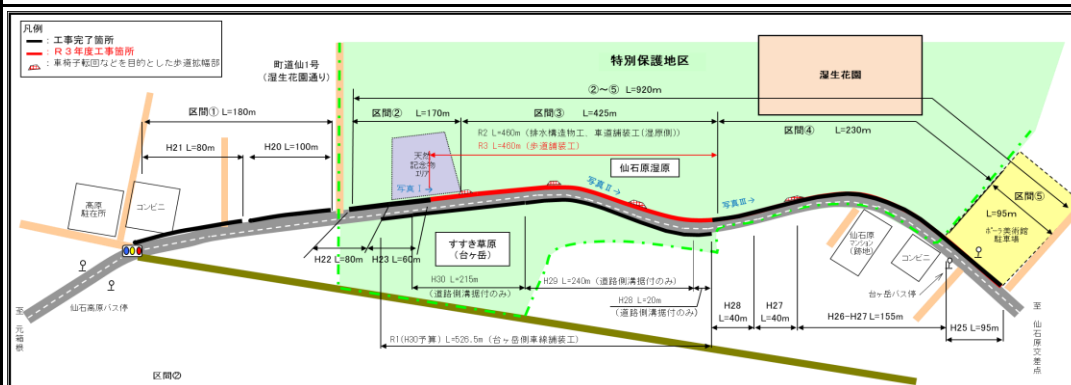

資料提供：神奈川県小田原土木センター

地域	仙石原地域	番号	27
施策区分①	都市基盤整備	施策区分②	道路

事業等名	県道731号（南足柄市と箱根町を連絡する道路）整備		
所管	町	環境整備部都市整備課	
	町以外の機関	神奈川県県西土木事務所小田原土木センター	
事業年度	平成25年度 ～ 令和5年度		


平成29年度～令和8年度（本プラン計画期間）の事業等の概要
 災害発生時の代替ルートの確保と観光振興をはじめとする地域活性化に資する新設の県道を整備する（箱根町区間延長L = 2.3 km、標準幅員W = 5.0 m）。

令和6年度までの事業等の実施状況

計画達成度		年度	内容
令和6年度まで	全体	平成29年度～令和3年度	主要な施策の達成状況(前期分)参照
		令和4年度	・土石流対策工事（2箇所）、安全対策工事（防護柵、土留板設置等）、凍雪害対策工事（積雪感知器設置）を実施。
		令和5年度	・安全対策工事（土留板設置等）及び凍雪害対策工事（積雪感知器設置）を実施。
A (完成)			

令和7年度の事業等の執行予定

※令和5年度をもって事業完結。

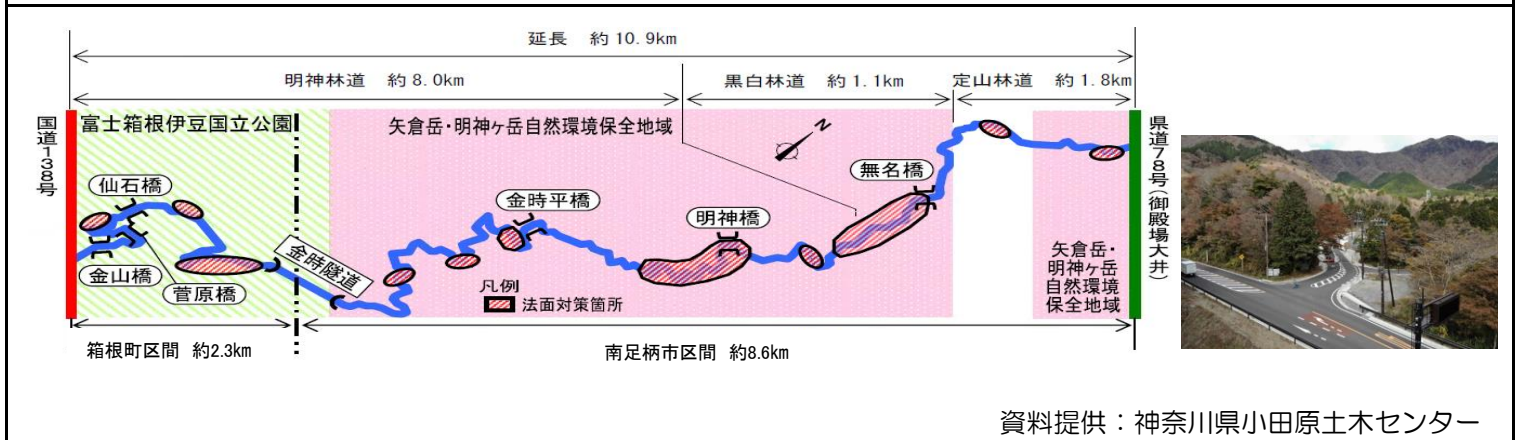

地域	仙石原地域	番号	28
施策区分①	都市基盤整備	施策区分②	道路

事業等名	県道738号（仙石原新田）整備		
所管	町	環境整備部都市整備課	
	町以外の機関	神奈川県県西土木事務所小田原土木センター	
事業年度	～		

平成29年度～令和8年度（本プラン計画期間）の事業等の概要

災害発生時における広域連携や東名高速道路裾野インターチェンジからのアクセス道路としての活用などが期待される県道738号（仙石原新田）の整備を促進する。

令和6年度までの事業等の実施状況

計画達成度		年度	内容
令和6年度まで	全体	平成29年度～令和3年度	主要な施策の達成状況(前期分)参照
E (未着手) (実施に向け検討中)	E (未着手) (実施に向け検討中)	令和4年度	・ 県道仙石原新田線の静岡県側については拡幅工事等の道路改良が進んでいることから、神奈川県に対して、県道としての供用を引き続き要望。
		令和5年度	・ 県道仙石原新田線の静岡県側については拡幅工事等の道路改良が進んでいることから、神奈川県に対して、県道としての供用を引き続き要望。
		令和6年度	・ 県道仙石原新田線の静岡県側については拡幅工事等の道路改良が進んでいることから、神奈川県に対して、県道としての供用を引き続き要望。

令和7年度の事業等の執行予定

・ 継続要望。

静岡県道337号（仙石原新田）整備状況



出典：静岡県沼津土木事務所ホームページ

地域	仙石原地域	番号	29
施策区分①	都市基盤整備	施策区分②	道路

事業等名	町民と観光客の安全確保と利便性に資する町道整備（仙石原地域）		
所管	町	環境整備部都市整備課	
	町以外の機関	-	
事業年度	平成29年度 ~ 令和8年度		

平成29年度～令和8年度（本プラン計画期間）の事業等の概要

路面状態の調査を基に老朽化している路線から優先的に舗装の打替えを行う等、町道の道路機能が維持されるよう適切に管理を行う。

令和6年度までの事業等の実施状況

計画達成度		年度	内容
令和6年度まで	全体	平成29年度 ～令和3年度	主要な施策の達成状況(前期分)参照
B (一部達成) (達成率75%以上)	C (事業中) (進捗率50%以上)	令和4年度	<ul style="list-style-type: none"> 町道仙3号線道路整備工事(A s 舗装工 L = 95m)を実施。 町道仙96号線道路整備工事(A s 舗装工 L = 226m)を実施。 仙石原町有道路整備工事(A s 舗装工 L = 46m)を実施。
		令和5年度	<ul style="list-style-type: none"> 町道仙3号線道路整備工事(L = 108m)を実施。 町道仙12号線道路整備工事(L = 104.7m)を実施。 町道仙96号線道路整備工事(L = 340m)を実施。
		令和6年度	<ul style="list-style-type: none"> 町道仙18号線道路整備工事(L = 100m)を実施。 町道仙12号線道路整備工事(L = 122m)を実施。 町道仙212号線道路整備工事(L = 256m)を実施。

令和7年度の事業等の執行予定

- 町道仙12号線道路整備工事(L = 118m)を実施。
- 町道仙212号線道路整備工事(L = 250m)を実施。

地域	仙石原地域	番号	30
施策区分①	都市基盤整備	施策区分②	公園

事業等名	仙石原公園整備事業		
所管	町	環境整備部都市整備課	
	町以外の機関	-	
事業年度	平成29年度 ~ 令和8年度		
平成29年度～令和8年度（本プラン計画期間）の事業等の概要			
緑豊かで憩いの場となっている環境を生かし、多くの人々が集うレクリエーションの場としての空間形成を図る。			
令和6年度までの事業等の実施状況			
計画達成度		年度	内容
令和6年度まで	全体	平成29年度 ～令和3年度	主要な施策の達成状況(前期分)参照
A (達成) (達成率100%)	D (事業中) (進捗率50%未満)	令和4年度	・公園内の良好な環境を維持するため、公園の清掃や草刈り等を実施するとともに、老朽化が進んだ鉄棒やフェンスの更新を実施。 ・仙石原いこいの家の利用者の安全制度利便性の確保するため、トップライト等の修繕や浴室内洗い場の防滑処理を実施。
		令和5年度	・公園内の良好な環境を維持するため、公園の清掃や草刈り等を実施。 ・仙石原いこいの家の利用者の安全性と利便性の向上を図るため、浴室内洗い場の防滑処理や浴槽の石目地修繕を実施。
		令和6年度	・公園内の良好な環境を維持するため、公園の清掃や草刈り等を実施。 ・都市計画決定範囲見直しの可否を判断するため、公園区域の測量を実施。 ・仙石原いこいの家の利用者の安全性と利便性の向上を図るため、浴室内洗い場の防滑処理を実施。
令和7年度の事業等の執行予定			
<ul style="list-style-type: none"> 引き続き公園の良好な環境を維持するため、公園の清掃や草刈等を実施。 仙石原いこいの家について、適切な維持管理を継続することで利用者の安全性と利便性の向上を図る。 			

地域	仙石原地域	番号	31
施策区分①	都市基盤整備	施策区分②	下水道・河川

事業等名	第2号公共下水道整備（仙石原地域）		
所管	町	環境整備部上下水道温泉課	
	町以外の機関	-	
事業年度	昭和50年度 ~ 令和12年度		

平成29年度～令和8年度（本プラン計画期間）の事業等の概要


公共下水道未供用区域の整備と終末処理場やポンプ場の長寿命化を進める。

令和6年度までの事業等の実施状況

計画達成度		年度	内容
令和6年度まで	全体	平成29年度 ～令和3年度	主要な施策の達成状況(前期分)参照
C (一部達成) (達成率50%以上)	B (事業中) (進捗率75%以上)	令和4年度	・新設町有道路へ管渠布設を行い、供用開始面積を増加させた。
		令和5年度	・未整備区域の管渠布設を行い、供用開始面積を増加させた。 ・管渠布設後の路面復旧を実施。 ・仙石原浄水センター汚泥移送機械設備の老朽化が進んだ機器を更新した。
		令和6年度	・大川橋ポンプ場の機械電気設備改築更新工事を発注。 ・老朽化した鉄蓋の改築更新を実施。


令和7年度の事業等の執行予定

- ・令和6年度に引き続き、大川橋ポンプ場の機械電気設備改築更新工事を実施。
- ・未整備区域の管渠布設を実施。
- ・老朽化した鉄蓋の改築更新を引き続き実施。

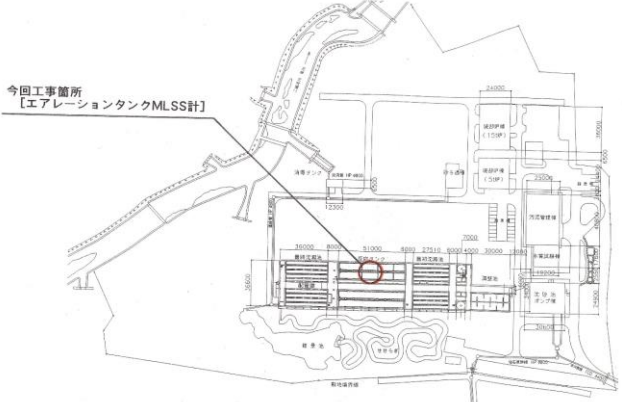

今回工事箇所
【エアレーションタンクMLSS計】

仙石原浄水センター電気設備整備工事 完成



地域	仙石原地域	番号	32
施策区分①	都市基盤整備	施策区分②	砂防

事業等名	大涌沢地すべり対策		
所管	町	環境整備部都市整備課	
	町以外の機関	神奈川県県西土木事務所小田原土木センター	
事業年度	平成24年度 ~		

平成29年度～令和8年度（本プラン計画期間）の事業等の概要


大涌沢の地すべり及び土石流災害の防止を図るため、砂防工事を促進する。

令和6年度までの事業等の実施状況

計画達成度		年度	内容
令和6年度まで	全体	平成29年度 ～令和3年度	主要な施策の達成状況(前期分)参照
A (達成) (達成率100%)	B (事業中) (進捗率75%以上)	令和4年度	・地すべり挙動及び火山ガスの状況を観測。 ・下湯えん堤の耐震補強時に必要な工事用道路工を実施。
		令和5年度	・地すべり挙動及び火山ガスの状況を観測。 ・下湯えん堤の耐震補強時に必要な工事用道路工を実施。
		令和6年度	・地すべり挙動及び火山ガスの状況を観測。 ・下湯えん堤の耐震補強時に必要な工事用道路工を実施。

令和7年度の事業等の執行予定

- ・地すべり挙動及び火山ガスの状況を観測。
- ・下湯えん堤の耐震補強時に必要な工事用道路工を実施。
- ・観測結果や専門家意見を踏まえた対策方法の検討を実施。

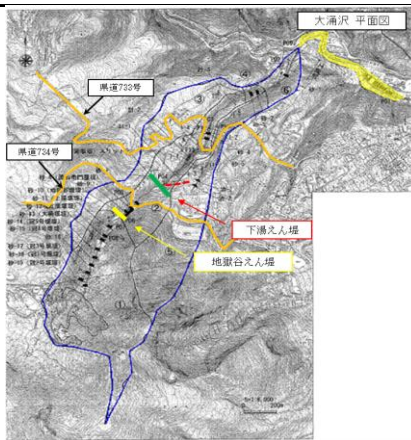

資料提供：神奈川県小田原土木センター

地域	仙石原地域	番号	33
施策区分①	景観形成	施策区分②	—

事業等名	すすき草原をはじめとする優れた自然景観の保全と高原情緒あふれる落ち着いた街なみ景観の形成		
所管	町	環境整備部都市整備課	
	町以外の機関	—	
事業年度	平成21年度 ~ 令和10年度		

平成29年度～令和8年度（本プラン計画期間）の事業等の概要

町固有の優れた自然景観の保全と歴史や文化に根差した街なみ景観の形成を図る。

令和6年度までの事業等の実施状況

計画達成度		年度	内容
令和6年度まで	全体	平成29年度 ～令和3年度	主要な施策の達成状況(前期分)参照
D (一部達成) (達成率50%未満)	D (事業中) (進捗率50%未満)	令和4年度	・フェイスブックページによる定期的な広報の継続。 ・インスタグラムによる定期的な広報の継続。 ・景観セミナーの開催。
		令和5年度	・フェイスブックページによる定期的な広報の継続。 ・インスタグラムによる定期的な広報の継続。 ・景観色彩パンフレット作成。
		令和6年度	・フェイスブックページによる定期的な広報の継続。 ・インスタグラムによる定期的な広報の継続。 ・景観色彩パンフレット増刷。 ・まちづくりアドバイザーに1名新たに委嘱。

令和7年度の事業等の執行予定

- ・ 広報、回覧、その他SNS等による景観施策の周知、街並み景観の紹介。
- ・ 景観まちづくり協力店認定制度の周知及び推進。
- ・ 景観まちづくり修景費補助制度の周知及び推進。
- ・ まちづくりアドバイザー派遣制度の周知及び促進。

●景観まちづくり協力店（仙石原地域）

仙石原地域第3号店 お茶の間酒房MONTA



●箱根町景観だより（インスタグラム）



地域	仙石原地域	番号	34
施策区分①	その他	施策区分②	自然探勝路

事業等名	金時山ハイキングコースなどの維持整備		
所管	町	企画観光部観光課	
	町以外の機関	-	
事業年度	平成20年度 ~ 令和8年度		

平成29年度～令和8年度（本プラン計画期間）の事業等の概要

ハイキングコースの維持整備を行うとともに、外国人観光客にも適切な誘導を図れるようにするため、指導標等の多言語化やピクトグラムの活用を推進する。

令和6年度までの事業等の実施状況

計画達成度		年度	内容
令和6年度まで	全体	平成29年度 ～令和3年度	主要な施策の達成状況(前期分)参照
B (一部達成) (達成率75%以上)	B (事業中) (進捗率75%以上)	令和4年度	・ 矢倉沢-明神コースの指導標を改修した。 ・ 倒木などでハイキングコースの通行に支障が生じた際は、随時対応を行った。 ・ ハイキングコースの状況や案内板などの現状把握のため、定期的な見回り調査を行った。
		令和5年度	・ ハイキングコース内に発生した倒木については、通報があった際や踏査を行った際に随時対応を行った。
		令和6年度	・ 金時山ハイキングコース沿いにある金太郎伝説ゆかりのスポットの4箇所に説明版を設置した。説明版には英語標記を記載し、更にQRコードを活用し多言語化を図った。

令和7年度の事業等の執行予定

・ ハイキングコース内の点検及び巡視は引き続き定期的実施する。



← 令和6年度
説明版設置



ハイキングコース補修活動

地域	箱根地域	番号	35
施策区分①	都市基盤整備	施策区分②	道路

事業等名	凍雪害対策強化のための芦之湯基地の整備		
所管	町	企画観光部観光課・環境整備部都市整備課	
	町以外の機関	神奈川県県西土木事務所小田原土木センター	
事業年度	平成27年度 ～ 平成30年度		

平成29年度～令和8年度（本プラン計画期間）の事業等の概要


国道1号の最高標高地点付近にあり積雪等により頻繁に通行障害が発生する芦之湯地区に凍雪害基地を設置し、除雪及び凍結防止剤散布等の作業を迅速かつ効率的に実施する。

令和6年度までの事業等の実施状況

計画達成度		年度	内容
令和6年度まで	全体	平成29年度 ～令和3年度	主要な施策の達成状況(前期分)参照
A	(完成)		

令和7年度の事業等の執行予定

※平成30年度をもって事業完結。

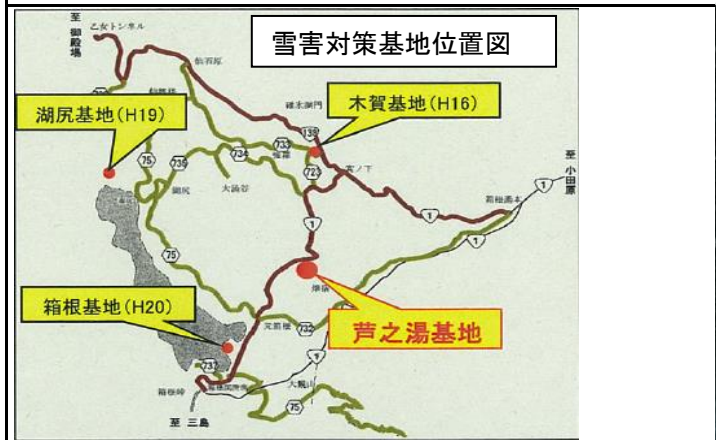

地域	箱根地域	番号	36
施策区分①	都市基盤整備	施策区分②	道路

事業等名	町民と観光客の安全確保と利便性に資する町道整備（箱根地域）		
所管	町	環境整備部都市整備課	
	町以外の機関	-	
事業年度	平成29年度 ～ 令和8年度		

平成29年度～令和8年度（本プラン計画期間）の事業等の概要

路面状態の調査を基に老朽化している路線から優先的に舗装の打替えを行う等、町道の道路機能が維持されるよう適切に管理を行う。

令和6年度までの事業等の実施状況

計画達成度		年度	内容
令和6年度まで	全体	平成29年度 ～令和3年度	主要な施策の達成状況(前期分)参照
B	C	令和4年度	<ul style="list-style-type: none"> 町道箱1号線道路整備工事(A s 舗装工 L = 55m)を実施。 町道箱1号線道路改良工事(L = 100m)を実施。
		令和5年度	<ul style="list-style-type: none"> 町道箱1号線道路改良整備工事(L = 156m)を実施。 町道箱114号線道路整備工事(L = 100m)を実施。 町道箱113号線道路整備工事(L = 42.6m)を実施。 町道箱113号線道路整備工事(その2)(L = 7.0m)を実施。
		令和6年度	<ul style="list-style-type: none"> 町道箱1号線道路改良整備工事(L = 120m)を実施。 町道箱114号線道路維持工事(L = 105m)を実施。
(一部達成) (達成率75%以上)	(事業中) (進捗率50%以上)		

令和7年度の事業等の執行予定

- 町道箱1号線道路改良整備工事(L = 100m)を実施。
- 町道箱114号線道路維持工事(L = 110m)を実施。

地域	箱根地域	番号	37
施策区分①	都市基盤整備	施策区分②	下水道

事業等名	第2号公共下水道整備（箱根地域）		
所管	町	環境整備部上下水道温泉課	
	町以外の機関	-	
事業年度	昭和50年度 ~ 令和12年度		

平成29年度～令和8年度（本プラン計画期間）の事業等の概要


公共下水道未供用区域の整備と終末処理場やポンプ場の長寿命化を進める。

令和6年度までの事業等の実施状況

計画達成度		年度	内容
令和6年度まで	全体	平成29年度 ～令和3年度	主要な施策の達成状況(前期分)参照
C (一部達成) (達成率50%以上)	B (事業中) (進捗率75%以上)	令和4年度	・鉄蓋の改築更新を実施。 ・防ヶ沢ポンプ場、樹木園ポンプ場の機会電気設備改築を実施。
		令和5年度	・老朽化した鉄蓋の改築更新を実施。
		令和6年度	・蛭川ポンプ場の機械電気設備改築更新工事を発注。 ・老朽化した鉄蓋の改築更新を実施。

令和7年度の事業等の執行予定

- ・令和6年度に引き続き、蛭川ポンプ場の機械電気設備改築更新工事を実施。
- ・箱根及び元箱根ポンプ場の老朽化した機械電気設備の改築更新を実施。
- ・老朽化した鉄蓋の改築更新を引き続き実施。

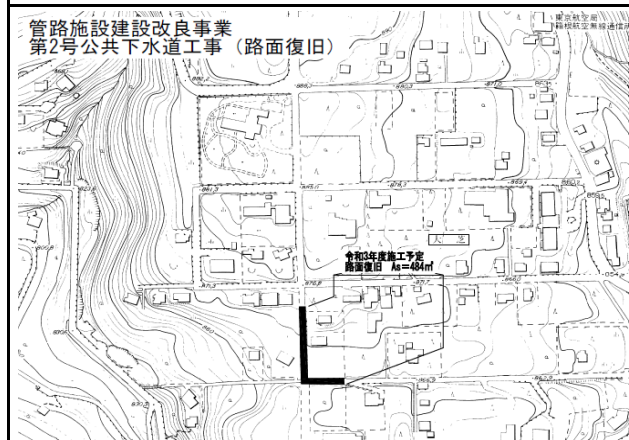

地域	箱根地域	番号	38
施策区分①	都市基盤整備	施策区分②	温泉

事業等名	町営温泉の安定供給		
所管	町	環境整備部上下水道温泉課	
	町以外の機関	-	
事業年度	平成29年度 ~ 令和8年度		

平成29年度～令和8年度（本プラン計画期間）の事業等の概要


地域の温泉需要に応える町営温泉の安定供給を図るために、老朽化している送・配湯管の改良を行う。

令和6年度までの事業等の実施状況


計画達成度		年度	内容
令和6年度まで	全体	平成29年度 ～令和3年度	主要な施策の達成状況(前期分)参照
A (達成) (達成率100%)	A (完成)	令和4年度	・温泉送湯管改良工事（L=130m）を実施。
		令和5年度	・温泉送湯管改良工事（L=69m）を実施。
		令和6年度	・温泉送湯管改良工事（L=59m）を実施。

令和7年度の事業等の執行予定


※令和6年度をもって事業完結。



温泉送・配湯管



大芝中継槽



地域	箱根地域	番号	39
施策区分①	景観形成	施策区分②	—

事業等名	門前町や宿場町としての歴史を生かした街なみ景観の形成		
所管	町	環境整備部都市整備課	
	町以外の機関	—	
事業年度	平成21年度 ~ 令和10年度		

平成29年度～令和8年度（本プラン計画期間）の事業等の概要

町固有の優れた自然景観の保全と歴史や文化に根差した街なみ景観の形成を図る。

令和6年度までの事業等の実施状況

計画達成度		年度	内容
令和6年度まで	全体	平成29年度 ～令和3年度	主要な施策の達成状況(前期分)
D (一部達成) (達成率50%未満)	D (事業中) (進捗率50%未満)	令和4年度	・フェイスブックページによる定期的な広報の継続。 ・インスタグラムによる定期的な広報の継続。 ・景観セミナーの開催。
		令和5年度	・フェイスブックページによる定期的な広報の継続。 ・インスタグラムによる定期的な広報の継続。 ・景観色彩パンフレット作成。
		令和6年度	・フェイスブックページによる定期的な広報の継続。 ・インスタグラムによる定期的な広報の継続。 ・景観色彩パンフレット増刷。 ・まちづくりアドバイザーに1名新たに委嘱。

令和7年度の事業等の執行予定

- ・ 広報、回覧、その他SNS等による景観施策の周知、街並み景観の紹介。
- ・ 景観まちづくり協力店認定制度の周知及び推進。
- ・ 景観まちづくり修景費補助制度の周知及び推進。
- ・ まちづくりアドバイザー派遣制度の周知及び促進。

<p>●景観まちづくり協力店（箱根地域）</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>箱根地域第5号店 寄木細工専門店 一茶</p> </div> 	<p>●箱根町景観だより（インスタグラム）</p> 
---	---

地域	箱根地域	番号	40
施策区分①	その他	施策区分②	地域資源活用

事業等名	阿字ヶ池を含めた周辺整備を行うこと等による地域資源を生かした芦之湯地区の活性化		
所管	町	企画観光部観光課	
	町以外の機関	-	
事業年度	平成26年度 ~		

平成29年度～令和8年度（本プラン計画期間）の事業等の概要


阿字ヶ池周辺の整備を実施し、国民温泉保養地にも指定され、地域資源のある芦之湯地区の活性化を図る。
 (芦刈の里活性化事業)

令和6年度までの事業等の実施状況

計画達成度		年度	内容
令和6年度まで	全体	平成29年度 ～令和3年度	主要な施策の達成状況(前期分)参照
A	(完成)		

令和7年度の事業等の執行予定

※令和元年度をもって事業完結。

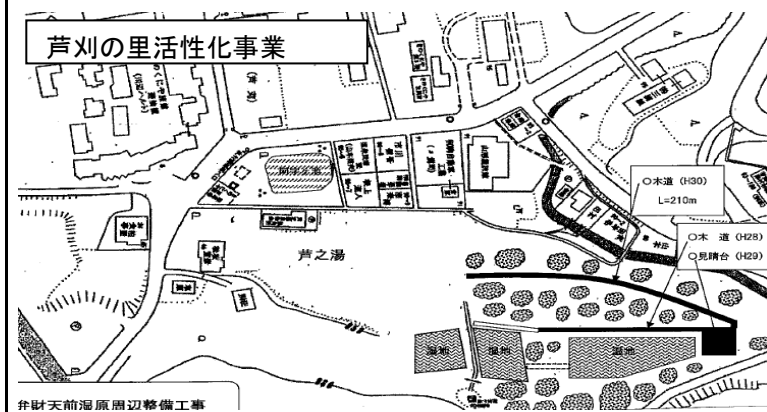

地域	箱根地域	番号	41
施策区分①	その他	施策区分②	自然探勝・歴史探訪

事業等名	箱根旧街道石畳ハイキングコースなどの維持整備		
所管	町	教育委員会生涯学習課	
	町以外の機関	-	
事業年度	平成20年度 ~ 令和8年度		

平成29年度～令和8年度（本プラン計画期間）の事業等の概要

往時の風情を偲ぶことができる箱根旧街道石畳ハイキングコースなどの維持整備を進める。

令和6年度までの事業等の実施状況

計画達成度		年度	内容
令和6年度まで	全体	平成29年度 ～令和3年度	主要な施策の達成状況(前期分)参照
C (一部達成) (達成率50%以上)	D (事業中) (進捗率50%未満)	令和4年度	・ 史跡箱根旧街道整備基本計画の策定(2年計画の2年目)。 ・ 杉並木の巡回調査、草刈り、補修等の日常管理。
		令和5年度	・ 保存活用計画及び整備基本計画に基づく箱根旧街道保存活用整備事業の実施。 ・ 箱根旧街道杉並木の巡回調査及び草刈り・補修等の日常管理。 ・ 石畳橋(畑宿地内)の橋梁点検実施。
		令和6年度	・ 保存活用計画及び整備基本計画に基づく、箱根旧街道保存活用整備事業の実施(①基本設計(畑宿山根地区)、②実施設計(畑宿千鳥橋上地区)、③埋蔵文化財発掘調査(畑宿千鳥橋上地区))。 ・ 箱根旧街道杉並木の巡回及び定点調査、並びに環境整備(草刈り・補修等)の実施。

令和7年度の事業等の執行予定

- ・ 保存活用計画及び整備基本計画に基づく、箱根旧街道保存活用整備事業の実施(①整備工事(畑宿千鳥橋上地区)、②実施設計(畑宿山根地区)、③埋蔵文化財発掘調査(畑宿千鳥橋上地区及び畑宿山根地区))。
- ・ 箱根旧街道杉並木の巡回及び定点調査、並びに環境整備(草刈り・補修等)の実施。
- ・ 箱根新道石畳橋改修工事設計業務。

文化財ボランティアとの協働による石畳維持管理



石畳橋の橋梁点検



地域	箱根地域	番号	42
施策区分①	その他	施策区分②	文化財保護・有効活用

事業等名	国指定史跡箱根旧街道杉並木の保護		
所管	町	教育委員会生涯学習課	
	町以外の機関	-	
事業年度	昭和59年度 ~		

平成29年度～令和8年度（本プラン計画期間）の事業等の概要

江戸時代の東海道の面影を残す国指定史跡箱根旧街道杉並木の保護を図る。

令和6年度までの事業等の実施状況

計画達成度		年度	内容
令和6年度まで	全体	平成29年度 ～令和3年度	主要な施策の達成状況(前期分)参照
C (一部達成) (達成率50%以上)	C (事業中) (進捗率50%以上)	令和4年度	・ 史跡箱根旧街道整備基本計画の策定(2年計画の2年目)。 ・ 杉並木の巡回調査、草刈り、補修等の日常管理。
		令和5年度	・ 保存活用計画及び整備基本計画に基づく箱根旧街道保存活用整備事業の実施。 ・ 箱根旧街道杉並木の巡回調査及び草刈り・補修等の日常管理。
		令和6年度	・ 保存活用計画及び整備基本計画に基づく、箱根旧街道保存活用整備事業の実施(①基本設計(畑宿山根地区)、②実施設計(畑宿千鳥橋上地区)、③埋蔵文化財発掘調査(畑宿千鳥橋上地区))。 ・ 箱根旧街道杉並木の巡回及び定点調査、並びに環境整備(草刈り・補修等)の実施。

令和7年度の事業等の執行予定

- ・ 保存活用計画及び整備基本計画に基づく、箱根旧街道保存活用整備事業の実施(①整備工事(畑宿千鳥橋上地区)、②実施設計(畑宿山根地区)、③埋蔵文化財発掘調査(畑宿千鳥橋上地区及び畑宿山根地区))。
- ・ 箱根旧街道杉並木の巡回及び定点調査、並びに環境整備(草刈り・補修等)の実施。
- ・ 箱根新道石畳橋改修工事設計業務。
- ・ 発掘調査の成果に係る現地説明会(畑宿地域地元住民対象)。

<p>箱根旧街道位置図(保存活用計画策定範囲)</p>	<p>文化財ボランティア(草刈)</p>
------------------------------------	-----------------------------

地域	箱根地域	番号	43
施策区分①	その他	施策区分②	文化財保護・有効活用

事業等名	鎌倉古道などの既存の散策路を生かして地域内の回遊性を高めることによる各地区固有の歴史的文化遺産の有効活用と地域活性化		
所管	町	教育委員会生涯学習課	
	町以外の機関	-	
事業年度	平成29年度 ~ 令和8年度		

平成29年度～令和8年度（本プラン計画期間）の事業等の概要

鎌倉古道などの既存の散策路を生かして地域内の回遊性を高めることにより、各地区固有の歴史的文化遺産の有効活用と地域活性化を図る。

令和6年度までの事業等の実施状況

計画達成度		年度	内容
令和6年度まで	全体	平成29年度 ～令和3年度	主要な施策の達成状況(前期分)参照
C (一部達成) (達成率50%以上)	C (事業中) (進捗率50%以上)	令和4年度	・国史跡元箱根石仏群及び町史跡東光庵の日常的な維持管理の実施。 ・国史跡元箱根石仏群ガイダンス棟の将来計画に向けた関係者との協議の実施。
		令和5年度	・国史跡元箱根石仏群ガイダンス棟の解体工事及びそれに伴う諸手続き。 ・元箱根石仏群周辺整備に向けた調査研究。 ・国史跡元箱根石仏群及び町史跡東光庵熊野権現旧跡の日常的な維持管理の実施。
		令和6年度	・国指定史跡を含む元箱根石仏・石塔群周辺の整備に向けた調査研究を実施。 ・国指定史跡を含む元箱根石仏・石塔群及び町指定史跡である東光庵熊野権現旧跡の環境整備(草刈り・樹木剪定等)の実施。

令和7年度の事業等の執行予定

- ・国指定史跡を含む元箱根石仏・石塔群周辺の整備に向けた調査研究を実施。
- ・国指定史跡を含む元箱根石仏・石塔群及び町指定史跡である東光庵熊野権現旧跡の環境整備(草刈り・樹木剪定等)の実施。

国史跡元箱根石仏群ガイダンス棟) 修繕

